Detail B-B – Kaplice nádraží

Dopravně inženýrské opatření

Rozšíření vozovky Kaplice nádraží – sil. I/3; II/157

Zadavatel: **Swietelsky stavební s.r.o., p. J. Trs, tel: 702 211 801**		
Zpracoval: Jiří Kubeš ml.	Dne: 07.03.2024	
Email: technik@signistav.cz	Poznámka: **ET. 3**	
Telefon: +420 702 100 810		

Signistav DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

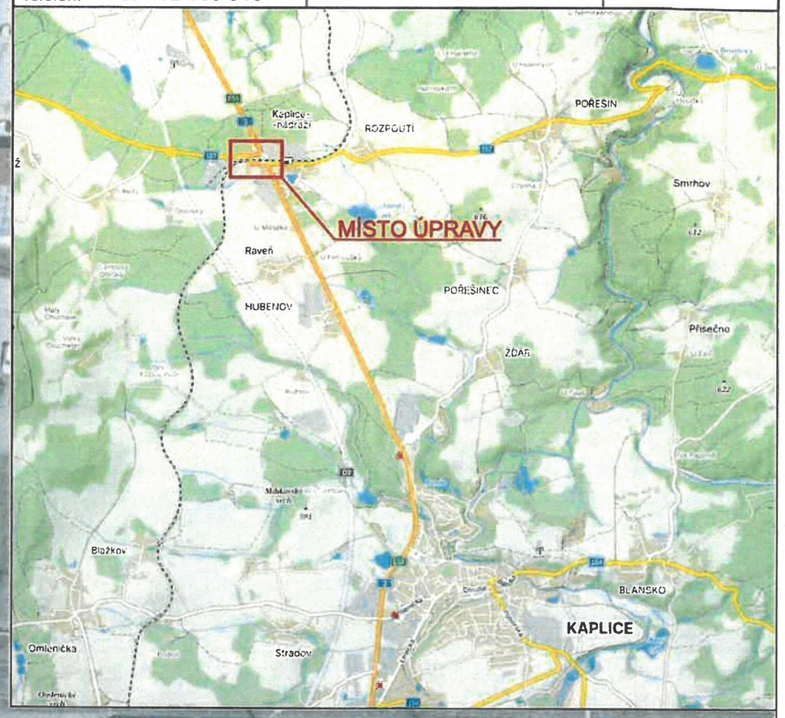

Č. Krumlov. II/157

úplná uzavírka

kyvadlový provoz

min 3m

stávající přechod pro chodce - zrušen

dočasná zastávka BUS

dočasná zastávka BUS

Mobilní semaforová souprava

Asistenci oprávněné osoby pro zastavení vozidel

KRAJSKÝ ÚŘAD • JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dopravní značení schváleno (1)
Č.j.: KUJCK 55111/2024
Ze dne 15. 2. 2024

nový přechod pro chodce - nevyznačen

stávající přechod pro chodce - zrušen

kyvadlový provoz

jednosměrný provoz

Trh. Sviny, II/157

stávající přechod pro chodce - zachován

min 3m

kyvadlový provoz

Kaplice, II/3

stávající přechod pro chodce - zrušen

Mobilní semaforová souprava

Ruční řízení provozu 07:00 - 19:00

dočasná zastávka BUS

ETAPA 3

PRÁCE PROVÁDĚNÉ V TERMÍNU TRAŤOVÉ VÝLUKY

Pracovní prostor, prostor výstavby a pohybu vozidel stavby

Práce prováděny na polovině vozovky sil. I/3 s kyvadlovým provozem. Semaforový interval soupravy bude nastaven o 15 sekund delší pro výstup a nástup chodců v dočasné zastávce. Sil. II/157 ve směru ČK úplně uzavřena, ve směru TS jednosměrný provoz. V úseku s kyvadlovým provozem nesmí docházet k jakémukoliv dalšímu omezení provozu.
